

調査日	2023年02月18日					測点	001	レベル	K B M	-0.45m	天候	晴			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県多気郡大台町										試験者名				
使用算式:	qa*=30.0+0.6Nw 但し、Nw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転抵抗以外の自沈の場合、qa*〔支持力〕は「-」を表示										最終貫入状況	硬等			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nw										水 位	G L -0.10m			
											最終貫入量	2.00m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 W50 (kN)	半回転数 N60 (回)	1m当たり 半回転数 N60 (回)	記 事		荷 重 W50 (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 N60 (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)	
					音響・感知	自沈状況	0.00	0.50	1.00						
							0.25	0.75		50	100	150	200	250	300
0.25	25	1.00	0	0		無回転抵抗								3.0	-
0.50	25	1.00	6	24										4.2	44.4
0.75	25	1.00	10	40										5.0	54.0
1.00	25	1.00	8	32										4.6	49.2
1.25	25	1.00	1	4		貫入音心								3.2	32.4
1.50	25	1.00	15	60										6.0	66.0
1.75	25	1.00	57	228		打撃								17.2	120.0
2.00	25	1.00	130	520		硬等								36.8	120.0

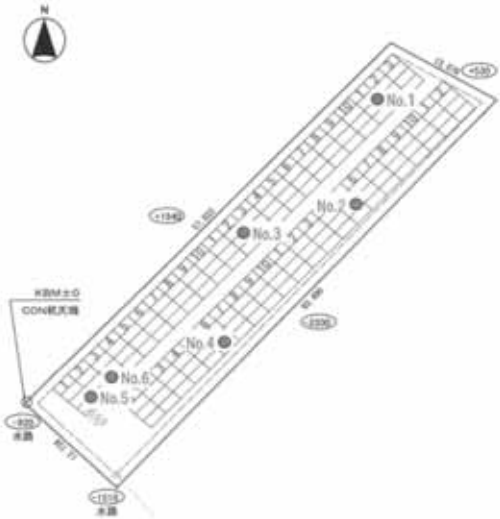
← 測点1のみ1800mm杭/

その他1600mm 測点4が1100mmで岩盤だがブレーカーでたたき割って1600mmの杭で打設可能。



多気郡大台町


測点1のみ1800mm杭/その他1600mm 測点4が1100mmで岩盤だが叩けば1600mmの杭で打設可能。現場的にはギリギリ0.2の重機が入れるかどうか。





調査日	2023年02月18日					測点	004		レベル	K B M -0.47m		天候	晴	
調査名												調査機器	ジオカルテ	
調査住所	三重県多気郡大台町											試験番号		
使用算式: $q_a = 30.0 + 0.6N_{sw}$ 但し、 $N_{sw}=150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで回轉抵抗以外の自沈の場合、 q_a (支持力) は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 $N=3W_{sw}+0.050N_{sw}$ 砂質土の場合 $N=2W_{sw}+0.067N_{sw}$											最終貫入状況		石当り空転	
											水位		G L -1.00m	
											最終貫入量		1.99m	
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 N _{sw} (kN)	半回轉数 N _a (回)	1m当たり 半回轉数 N _{sw} (回)	記 事		荷 重 N _{sw} (kN)		貫入量1m当たりの半回轉数 N _{sw} (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300						
0.25	25	0.05	0	0		数回回轉速						0.1	—	
0.50	25	1.00	0	0		数回回轉速						3.0	—	
0.75	25	1.00	3	12		自沈含む						3.6	37.2	
1.00	25	1.00	0	0		数回回轉速						3.0	—	
1.25	25	0.50	0	0		数回回轉速						1.5	—	
1.50	25	0.05	0	0		回轉急速						0.1	—	
1.75	25	0.05	0	0		回轉急速						0.1	—	
1.99	24	1.00	142	592	打撃・空転							41.6	120.0	

調査日	2023年02月18日					測点	005	レベル	K B M	-0.51m	天候	晴			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県多気郡大台町										試験番号				
使用算式:	qa=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転抵抗以外の自沈の場合、qa*(支持力)は「-」を表示										最終貫入状況	強反発			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	無			
											最終貫入量	0.38m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Nsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)		
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300							
0.25	25	0.50	0	0		無回転継ぎ							1.5	-	
0.38	13	1.00	106	815	強反発								56.6	120.0	

調査日	2023年02月18日					測点	001	レベル	K B M	-0.45m	天候	晴	
調査名											調査機器	ジオカルテ	
調査住所	三重県多気郡大台町										試験番号		
使用算式:	qa = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回轉抵抗以外の自沈の場合、qa (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	強等	
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水位	G L -0.10m	
											最終貫入量	2.00m	
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回轉数 Na (回)	1m当たり 半回轉数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Nsw (kN)		貫入量1m当たりの半回轉数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300					
0.25	25	1.00	0	0	回轉抵抗速							3.0	-
0.50	25	1.00	6	24								4.2	44.4
0.75	25	1.00	10	40								5.0	54.0
1.00	25	1.00	8	32								4.8	48.2
1.25	25	1.00	1	4	自沈含む							3.2	32.4
1.50	25	1.00	13	60								6.0	66.0
1.75	25	1.00	57	228	打撃							17.2	120.0
2.00	25	1.00	130	520	強等							26.8	120.0

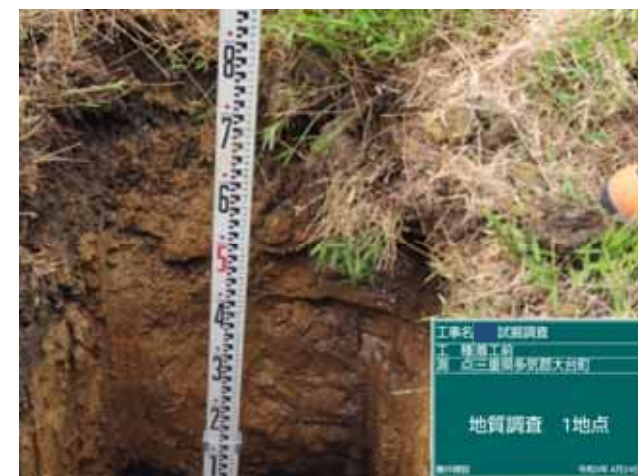

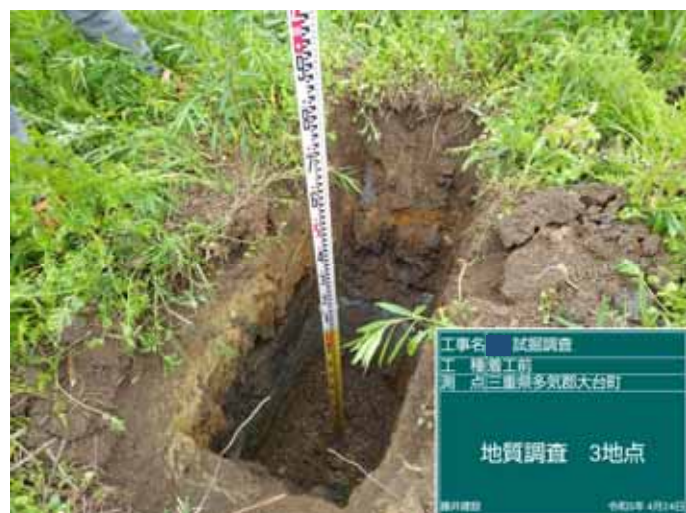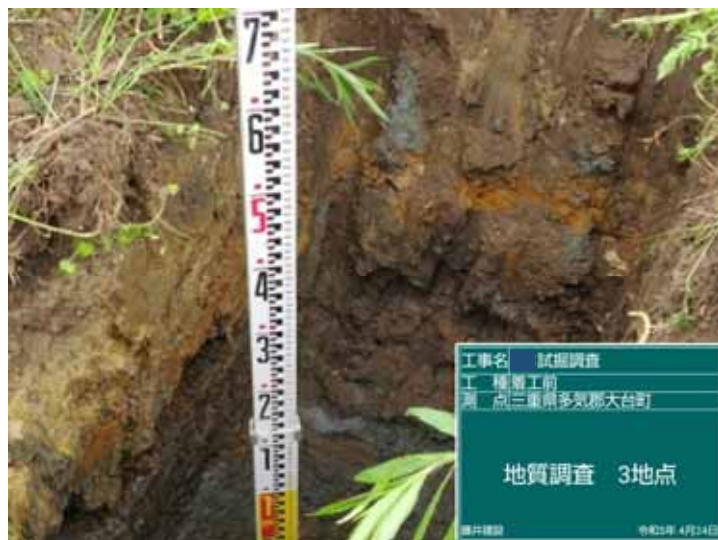








調査日	2023年03月16日					測点	001		レベル	K B M 0.00m		天候	晴				
調査名												調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県多気郡大台町											試験者名					
使用算式:	qa' = 30.0 + 0.6N5w 但し、N5w=150を超える場合は150とする 荷重1kNで鉛直繰進以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示											最終貫入状況	打撃				
換算N値:	粘性土の場合 N=3w5w+0.050N5w 砂質土の場合 N=2W5w+0.067N5w											水位	無				
												最終貫入量	2.91m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 W5w (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 N5w (回)	記 事		荷 重 R5a (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 N5w (回)			推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音価・感触	自沈状況	0.05 0.25 0.75										
0.25	25	1.00	28	112									黄色			9.5	97.2
0.50	25	1.00	26	104									黄色			8.9	92.4
0.75	25	1.00	8	32									黄色			4.6	49.2
1.00	25	1.00	5	20									黄色			4.0	42.0
1.25	25	1.00	3	12		曲成含む							黄色			3.6	37.2
1.50	25	1.00	1	4		曲成含む							黄色			3.2	32.4
1.75	25	1.00	2	8		曲成含む							黄色			3.4	34.8
2.00	25	1.00	5	20									黄色			4.0	42.0
2.25	25	1.00	4	16									黄色			4.2	44.4
2.50	25	1.00	29	116									黄色			9.7	99.6
2.75	25	1.00	88	352		打撃							緑色			29.9	120.0
2.91	16	1.00	108	675		打撃							緑色			42.2	120.0


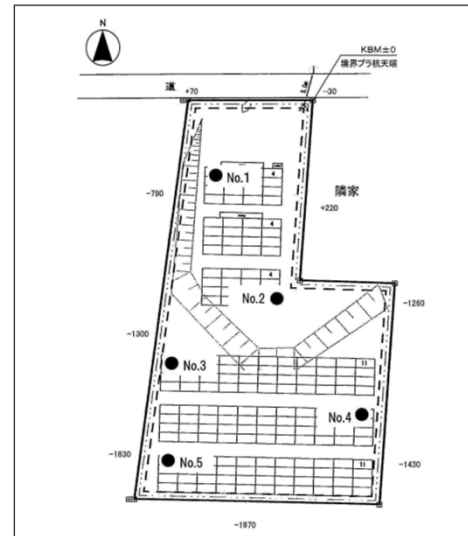


測点1表土障害物あり。
4tロング不可



調査日	2023年03月16日					測点	005	レベル	KBM	-1.61m	天候	晴			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県多気郡大台町										試験者名				
使用算式:	qa=30.0+0.6N5w 但し、N5w=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰進以外の自沈の場合、qa〔支持力〕は「-」を表示										最終貫入状況	打撃			
換算N値:	粘性土の場合 N=3W5w+0.050N5w 砂質土の場合 N=2W5w+0.067N5w										水 位	無			
											最終貫入量	1.60m			
貫入深さD (m)	貫入量L (cm)	荷重W5w (kN)	半回転数Na (回)	1m当たり半回転数N5w (回)	記 事		荷 重 (kN)			貫入量1m当たりの半回転数N5w (回)	推定土質	推定水位	換 算 値	支持力 (kN/m)	
					音価・感触	自沈状況	0.05	0.25	0.50	1.00	50 100 150 200 250 300				
0.25	25	0.25	0	0		無回転現象								0.7	-
0.50	25	1.00	3	12		曲成含む								3.6	37.2
0.75	25	1.00	5	20										4.0	42.0
1.00	25	1.00	4	16		曲成含む								3.8	39.6
1.25	25	1.00	5	20										4.0	42.0
1.50	25	1.00	52	208		打撃								15.9	120.0
1.60	10	1.00	109	1090		打撃								75.0	120.0

調査日	2023年03月16日	測点	004	レベル	K B M -1.58m	天候	晴				
調査名						調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県多気郡大台町					試験者名					
使用算式:	$q_a = 30.0 + 0.6N_{5w}$ 但し、 $N_{5w}=150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで鉛直繰進以外の自沈の場合、 q_a (支持力) は「-」を表示					最終貫入状況	打撃				
換算N値:	粘性土の場合 $N=3W_{5w}+0.050N_{5w}$ 砂質土の場合 $N=2W_{5w}+0.067N_{5w}$					水位	無				
						最終貫入量	3.62m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 W _{5w} (kN)	半回転数 N _a (回)	1m当たり 半回転数 N _{5w} (回)	記事	貫入量1m当たりの半回転数 N _{5w} (回)	推定土質	推定 水位	換算 N値	支持力 (kN/m ²)	
					音価・感触	自立状況	0.05 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300			
0.25	25	0.75	0	0		無回転現象				2.2	-
0.50	25	0.75	0	0		無回転現象				2.2	-
0.75	25	1.00	0	0		無回転現象				3.0	-
1.00	25	1.00	1	4		曲成含む				3.2	32.4
1.25	25	1.00	2	8		曲成含む				3.4	34.8
1.50	25	1.00	1	4		曲成含む				3.2	32.4
1.75	25	1.00	0	0		無回転現象				3.0	-
2.00	25	1.00	2	8		曲成含む				3.4	34.8
2.25	25	1.00	4	16		曲成含む				3.6	36.0
2.50	25	1.00	4	16		曲成含む				3.8	39.6
2.75	25	1.00	6	24						4.2	44.4
3.00	25	1.00	47	188		打撃				14.5	120.0
3.25	25	1.00	21	84						7.4	80.4
3.50	25	1.00	23	92						8.1	85.2
3.75	25	1.00	87	348		打撃				18.9	120.0
3.82	7	1.00	113	1614		打撃				110.1	120.0





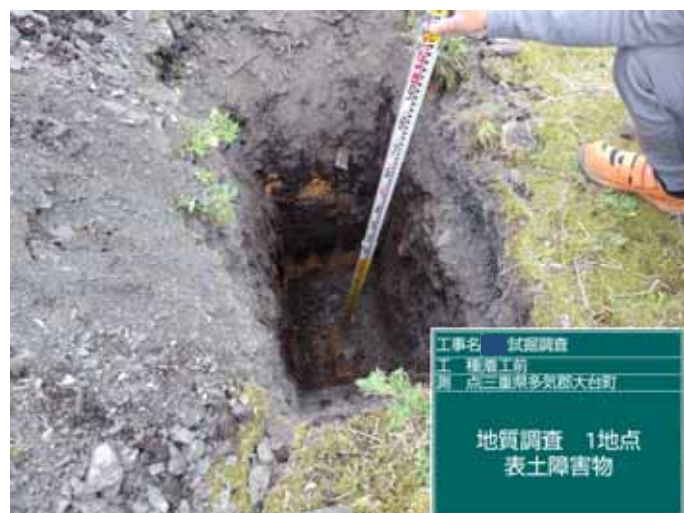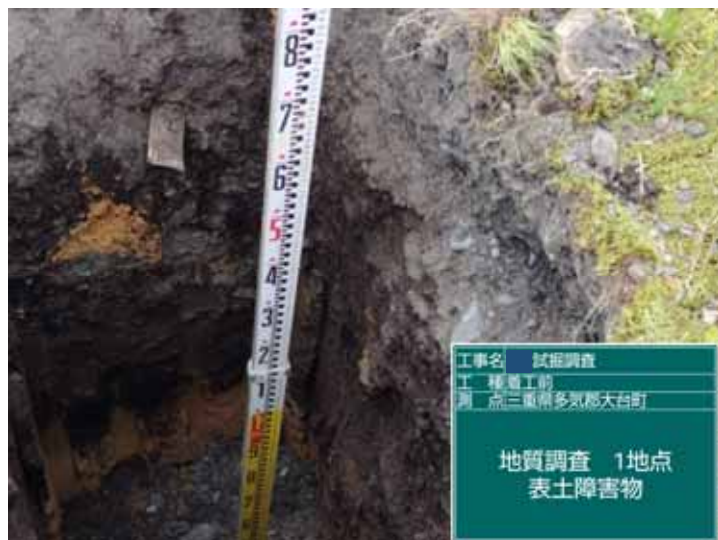




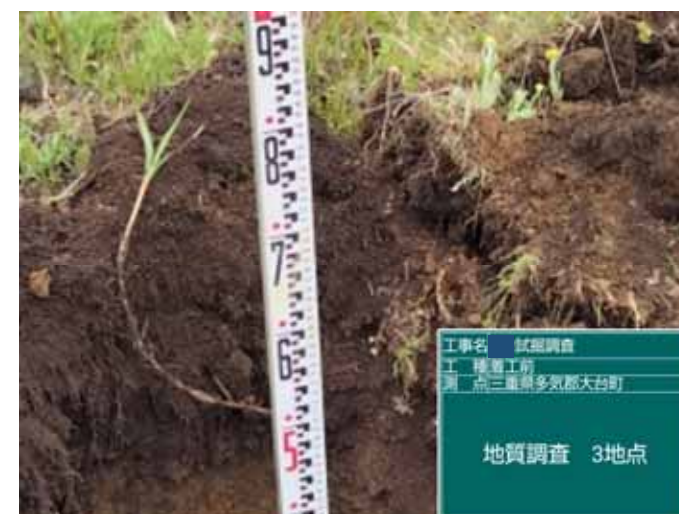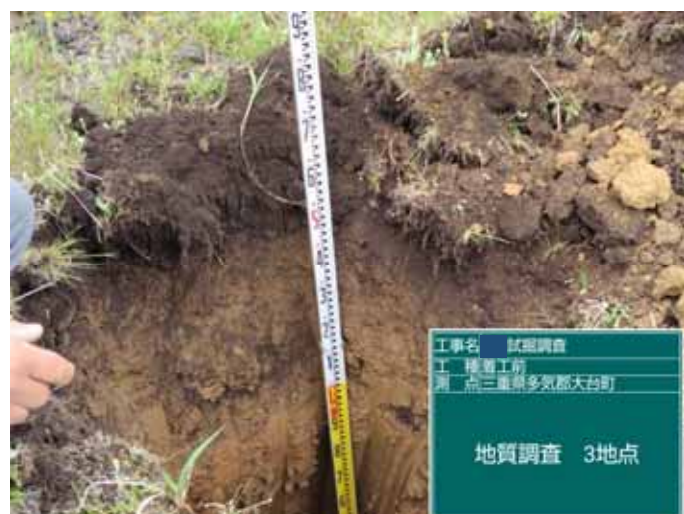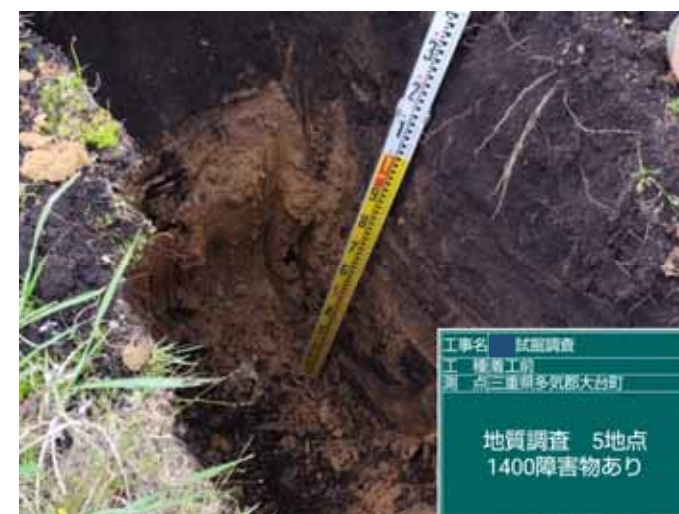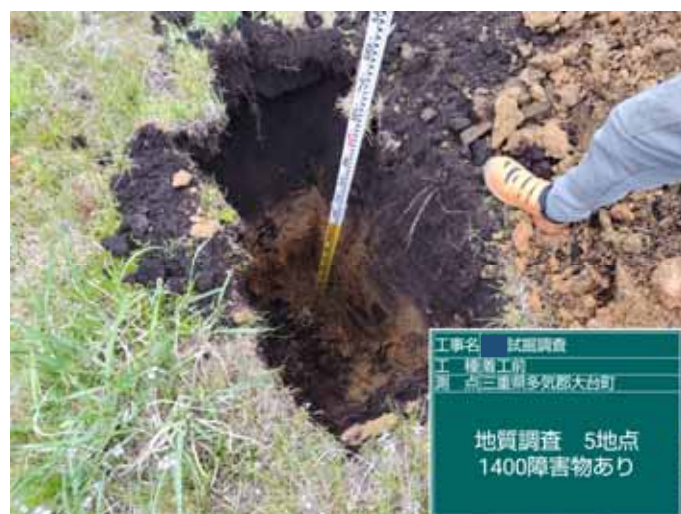





調査日	2023年02月14日					測点	001	レベル	K B M	+0.05m	天候	小雨			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県鈴鹿市越知町										試験者名				
使用算式:	qa = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw = 150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返以外の自沈の場合、qa (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	強反発			
換算N値:	粘性土の場合 N = 3Wsw + 0.050Nsw 砂質土の場合 N = 2Wsw + 0.067Nsw										水 位	無			
											最終貫入量	1.44m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)	
0.25	25	1.00	0	0	無回転繰返					50 100 150 200 250 300			3.0	-	
0.50	25	1.00	9	36									4.8	51.6	
0.75	25	1.00	20	80									7.3	78.0	
1.00	25	1.00	19	76									7.0	75.6	
1.25	25	1.00	35	140									11.3	114.0	
1.44	19	1.00	133	700	強反発								48.9	120.0	

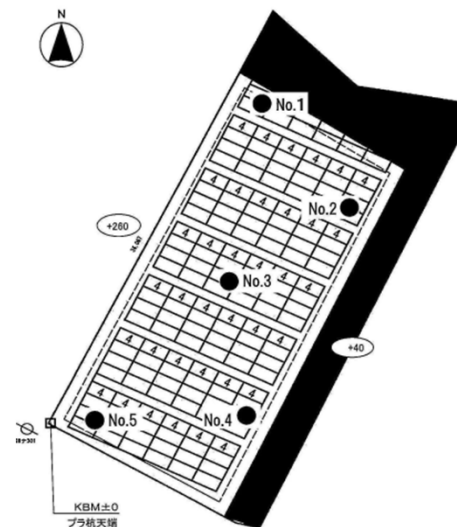



杭1600着工可能。


調査日	2023年02月14日					測点	003	レベル	K B M +0.14m					天候	小雨						
調査名											調査機器	ジオカルテ									
調査住所	三重県鈴鹿市越知町										試験者名										
使用算式:	qa = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、qa (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	打撃									
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw + 0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw + 0.067Nsw										水 位	無									
											最終貫入量	1.50m									
貫入深さD (m)	貫入量L (cm)	荷重Wsw (kN)	半回転数Na (回)	1m当たり半回転数Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)				貫入量1m当たりの半回転数Nsw (回)	推定土質	推定水位	換 算 値 N	支持力 (kN/㎡)						
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00	0.25						0.75	50	100	150	200	250
0.25	25	0.50	0	0	無回転繰返し										1.5	-					
0.50	25	0.75	0	0	無回転繰返し										2.2	-					
0.75	25	1.00	4	16	自沈含む										3.8	39.6					
1.00	25	1.00	9	36											4.8	51.6					
1.25	25	1.00	71	284	ジャリジャリ										21.0	120.0					
1.50	25	1.00	129	516	打撃										36.5	120.0					

調 査 日	2023年02月14日				測 点	005	レベ ル	K B M	-0.23m	天 候	小 雨	
調 査 名										調査機器	ジオカルテ	
調 査 住 所	三重県鈴鹿市越知町									試験者名		
使用算式:	qa' = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで10回繰返しの自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示									最終貫入状況	硬等	
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw									水 位	無	
										最終貫入量	1.67m	
貫入 深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事	荷 重 Wsw (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)
0.25	25	0.75	0	0	無回転繰返し				土質 判定 色 帯		2.2	-
0.50	25	0.75	0	0	無回転繰返し						2.2	-
0.75	25	0.50	0	0	無回転繰返し						1.5	-
1.00	25	1.00	38	152					砂質土		12.1	120.
1.25	25	1.00	88	340	ジャリジャリ				砂質土		24.7	120.
1.50	25	1.00	156	624	打撃				砂質土		43.8	120.
1.67	17	1.00	121	712	硬等				砂質土		48.6	120.



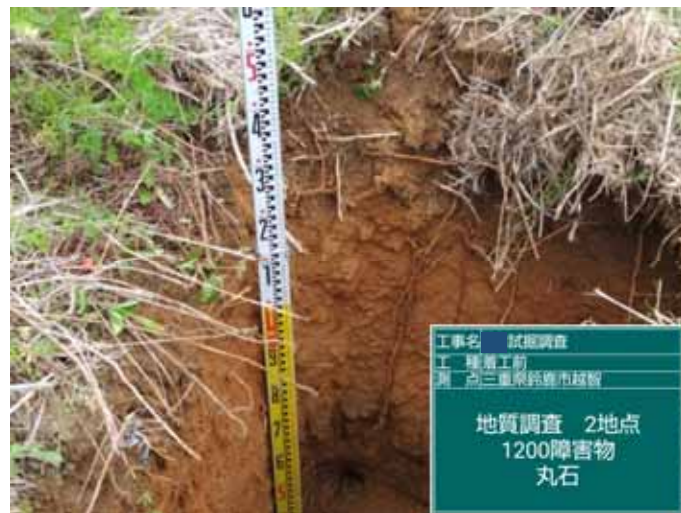

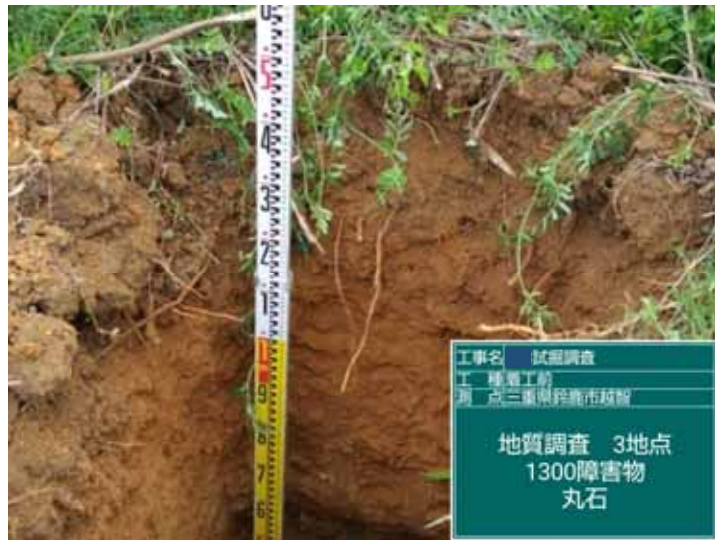

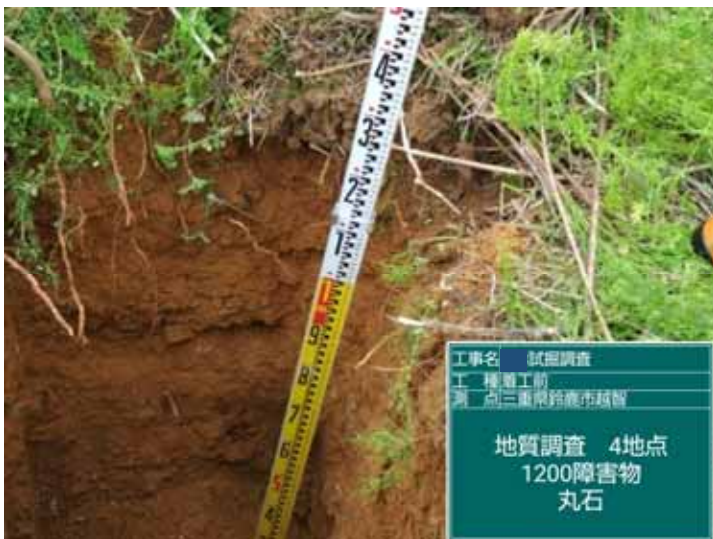








調査日	2023年04月10日					測点	001	レベル	K B M	-0.33m	天候	晴			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県鈴鹿市磯山町										試験者名				
使用算式:	qa' = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw = 150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転速度以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	強等			
換算N値:	粘性土の場合 N = 3Wsw + 0.050Nsw 砂質土の場合 N = 2Wsw + 0.067Nsw										水 位	G L -0.00m			
											最終貫入量	1.50m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00						
							0.25	0.75		50	100	150	200	250	300
0.25	25	0.15	0	0		無回転到達								0.4	-
0.50	25	0.75	0	0		無回転到達								2.2	-
0.75	25	1.00	10	40										5.0	54.0
1.00	25	1.00	22	88										7.8	82.8
1.25	25	1.00	53	212										16.2	120.0
1.50	25	1.00	114	456		強等								32.5	120.0



西側水路よりの漏水か？
地盤改良・地中障害でコスト大
着工難易度高



調査日	2023年04月10日					測点	005	レベル	K B M	-0.35m	天候	晴		
調査名											調査機器	ジオカルテ		
調査住所	三重県鈴鹿市磯山町字										試験者名			
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転速度以外の自沈の場合、qa'(支持力)は「-」を表示										最終貫入状況	強等		
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	G L -0.00m		
											最終貫入量	1.14m		
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事	荷 重 (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)		推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300						
0.25	25	0.50	0	0		無回転到達						1.5	-	
0.50	25	1.00	6	24								4.2	44.4	
0.75	25	1.00	25	100								8.7	90.0	
1.00	25	1.00	25	100								8.7	90.0	
1.14	14	1.00	109	779	強等							54.1	120.0	

調査日	2023年04月10日					測点	003	レベル	K B M +1.03m	天候	晴			
調査名										調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県鈴鹿市磯山町									試験者名				
使用算式:	qa' =30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転速度以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示									最終貫入状況	強等			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw									水 位	G L -0.00m			
										最終貫入量	2.64m			
貫入深さD (m)	貫入量L (cm)	荷重Wsw (kN)	半回転数Na (回)	1m当たりの半回転数Nsw (回)	記 事		荷 重Wsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数Nsw (回)	推定土質	推定水位	換 算N 値	支持力 (kN/㎡)	
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.25	0.50 0.75	1.00	50 100 150 200 250 300				
0.25	25	1.00	7	28								▽	4.4	46.8
0.50	25	1.00	14	56								▽	5.8	63.6
0.75	25	1.00	6	24									4.2	44.4
1.00	25	1.00	1	4		自沈含む							3.2	32.4
1.25	25	1.00	2	8		自沈含む							3.4	34.8
1.50	25	0.50	0	0		無回転到達							1.5	—
1.75	25	0.75	0	0		無回転到達							2.2	—
2.00	25	1.00	29	116								黄色	9.7	99.6
2.25	25	1.00	33	132								黄色	10.8	109.2
2.50	25	1.00	85	340		打撃						緑色	24.7	120.0
2.64	14	1.00	111	793		強等						緑色	55.1	120.0

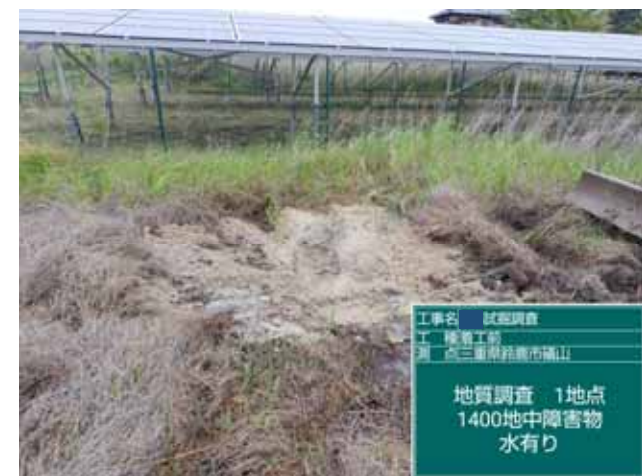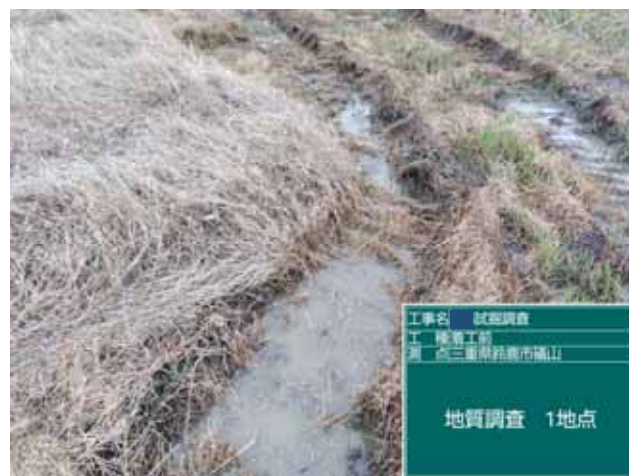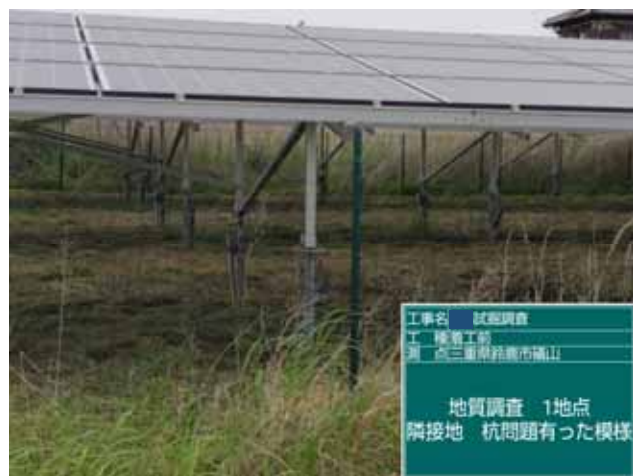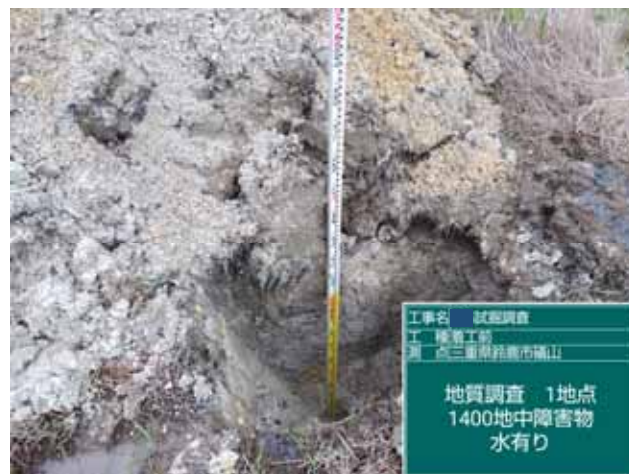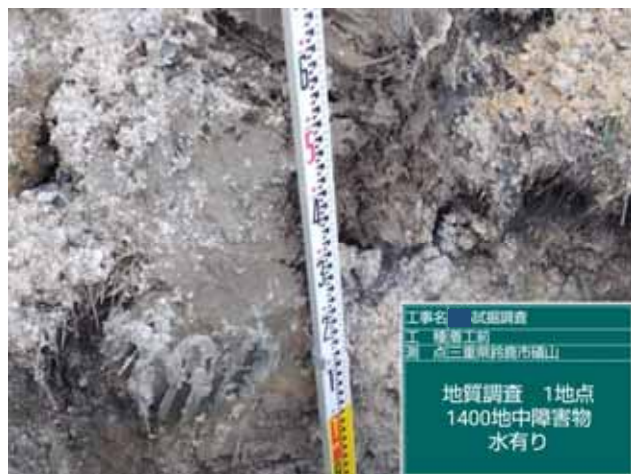






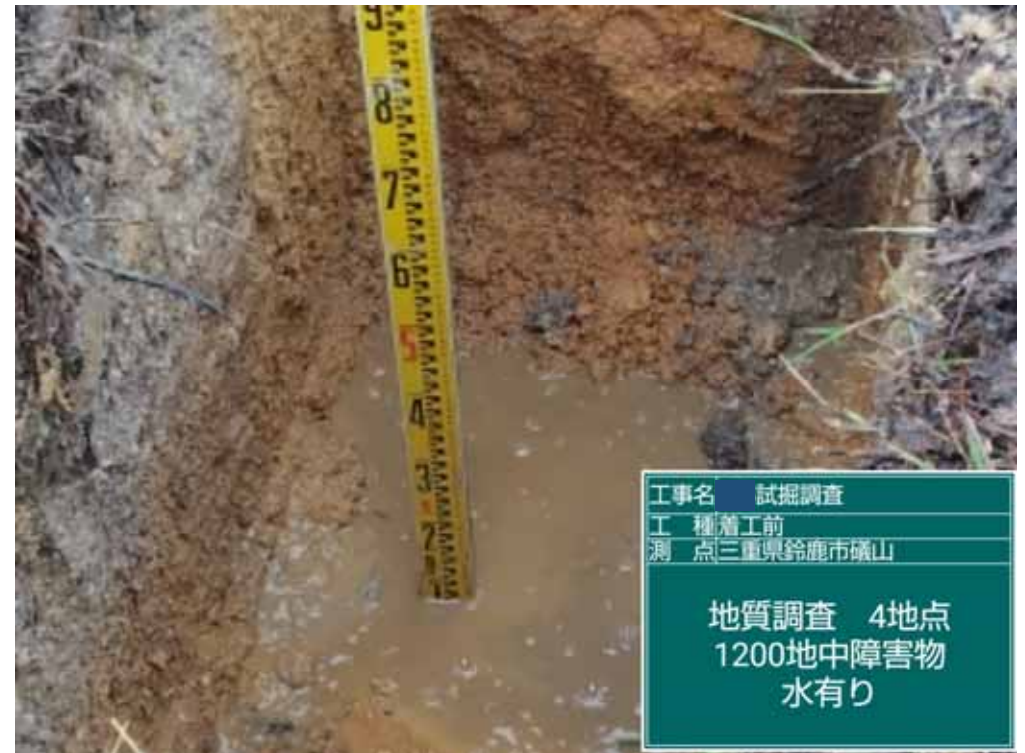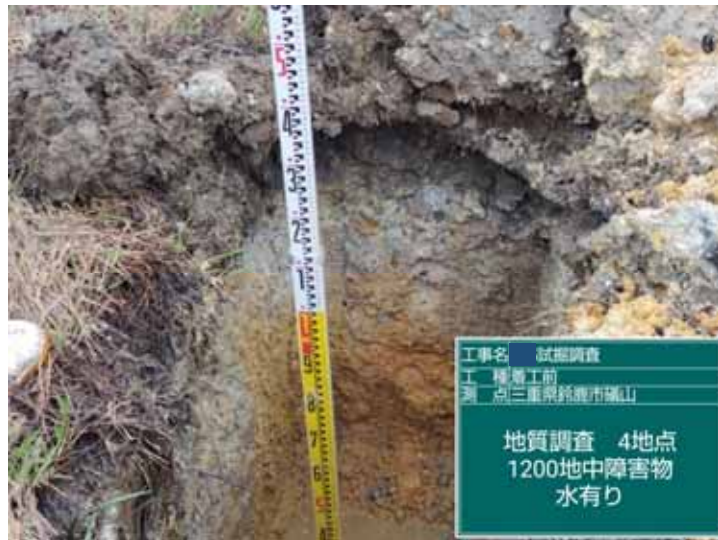




調査日	2023年03月16日				測点	005	レベル	K B M +0.63m	天候	晴				
調査名									調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県鈴鹿市東庄内町								試験者名					
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転継続以外の自沈の場合、qa'(支持力)は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw								最終貫入状況	打撃				
									水 位	無				
									最終貫入量	1.00m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Nsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定土質	推定水位	換 算 値 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300						
0.25	25	0.50	0	0		無回転継続							1.0	-
0.50	25	1.00	12	48									5.2	58.8
0.75	25	1.00	53	212		打撃							16.2	120.0
1.00	25	1.00	226	904		打撃							62.5	120.0


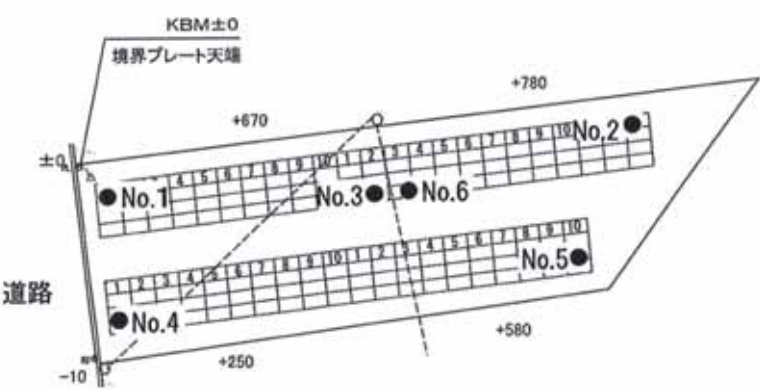





地中障害が浅い層にある。

調査日	2023年03月16日				測点	003	レベル	K B M +0.42m			天候	晴				
調査名											調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県鈴鹿市東庄内町										試験者名					
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転継続以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	打撃・空転				
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	無				
											最終貫入量	0.67m				
貫入 深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)				推定 土質	推定 水位	換 N 算 値	支持力 (kN/m ²)
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300								
0.25	25	0.05	0	0		無回転継続									0.1	-
0.50	25	1.00	8	32											4.1	49.2
0.67	17	1.00	121	712		打撃・空転									49.6	120.0

調査日	2023年03月16日					測点	001	レベル	K B M	+0.14m	天候	晴						
調査名											調査機器	ジオカルテ						
調査住所	三重県鈴鹿市東庄内町										試験者名							
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転速度以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	打撃						
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	無						
											最終貫入量	1.06m						
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 値	支持力 (kN/m ²)				
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00		50	100	150	200	250	300		
0.25	25	1.00	7	28			0.05	0.25	0.75								3.8	46.8
0.50	25	1.00	16	64													6.2	68.4
0.75	25	1.00	42	168		ガリガリ											13.2	120.0
1.00	25	1.00	99	396		打撃											28.5	120.0
1.06	6	1.00	132	2200		打撃											149.4	120.0

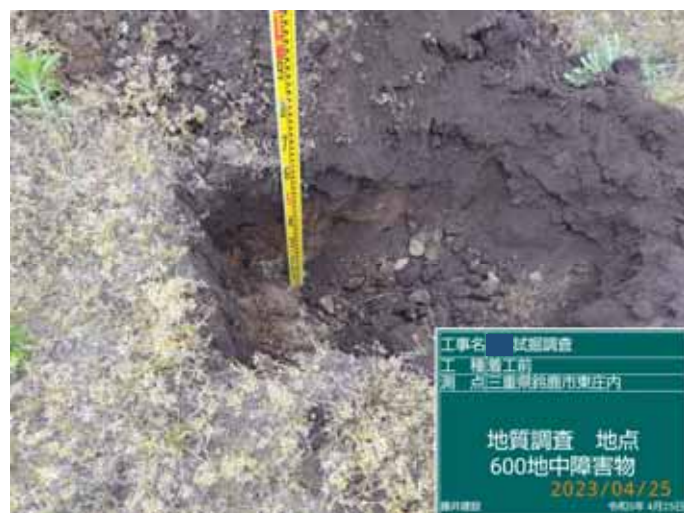

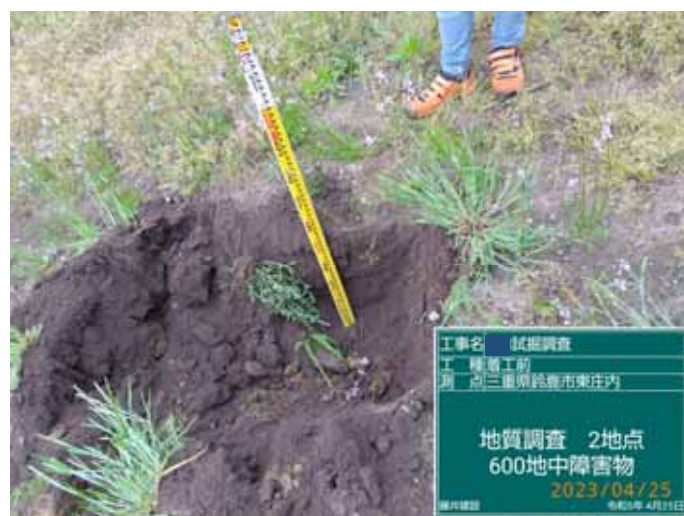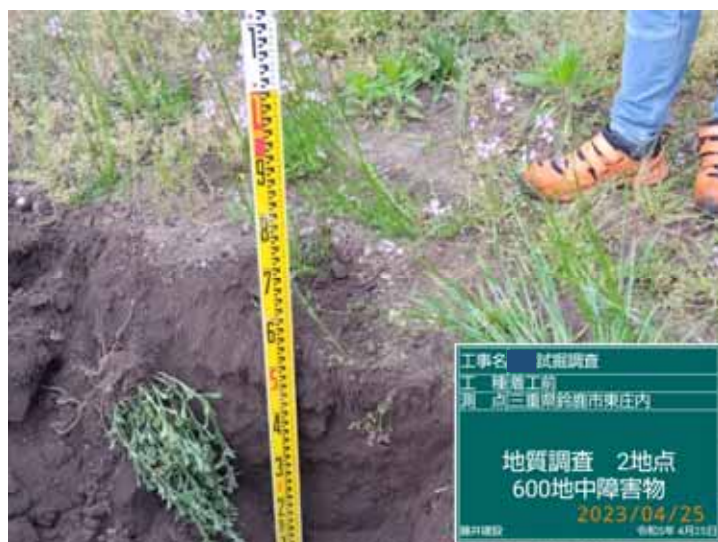


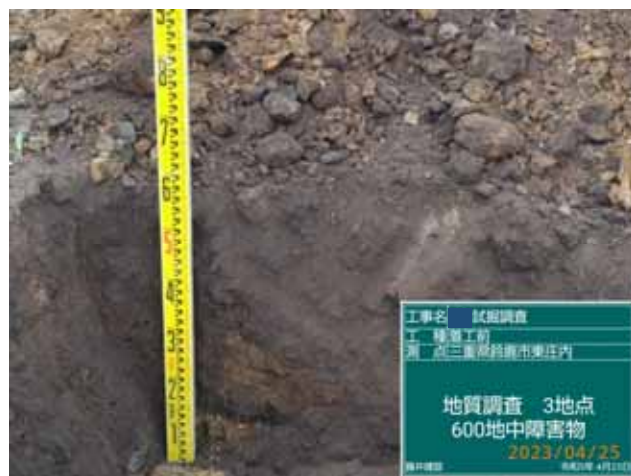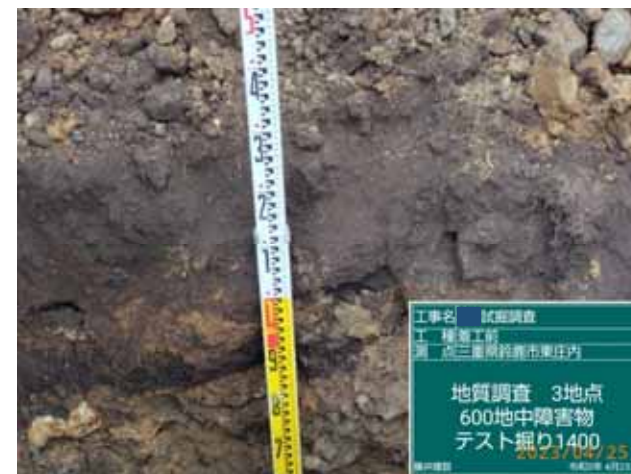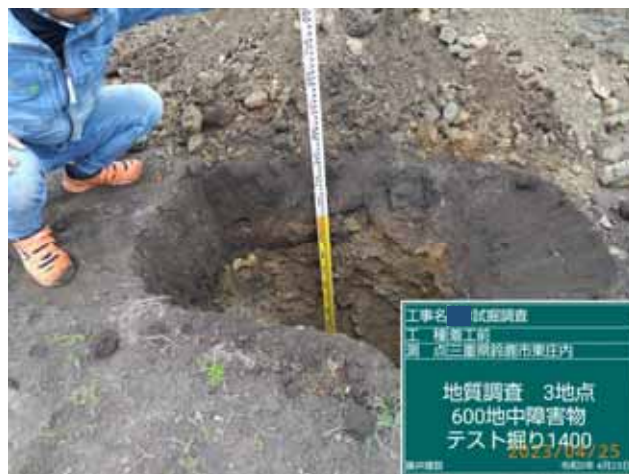







調査日	2023年03月27日					測点	003	レベル	K B M	-0.19m	天候	晴						
調査名											調査機器	ジオカルテ						
調査住所	三重県津市安濃町										試験者名							
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転距離以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	硬等						
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	無						
											最終貫入量	1.47m						
貫入深さD (m)	貫入量L (cm)	荷重Nsw (kN)	半回転数Na (回)	1m当たり半回転数Nsw (回)	記 事		荷 重 (kN)			貫入量1m当たりの半回転数Nsw (回)			推定土質	推定水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)		
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00		50	100	150	200	250	300		
							0.25	0.75										
0.25	25	0.05	0	0		無回転距離											0.1	-
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む											3.6	37.2
0.75	25	1.00	4	16		自沈含む											3.8	39.6
1.00	25	1.00	35	140	打撃												11.3	114.0
1.25	25	1.00	24	96													8.4	87.6
1.47	22	1.00	155	705	硬等												49.2	120.0

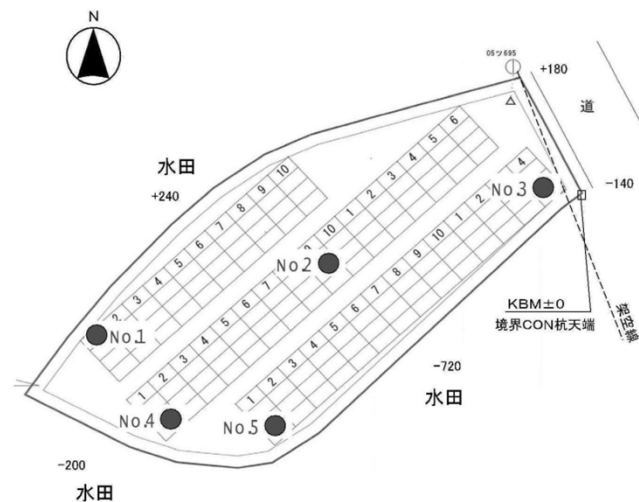

N-355隣接地。N-355に地中障害物あり。
同様の状況と思われる。


調査日	2023年03月27日					測点	001	レベル	K B M	-0.18m	天候	晴			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県津市安濃町										試験者名				
使用算式:	qa' = 30.0 + 0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転距離以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	硬等			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	無			
											最終貫入量	1.08m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)	
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00	50 100 150 200 250 300					
0.25	25	0.15	0	0		無回転距離								0.4	-
0.50	25	1.00	1	4		自沈含む								3.2	32.4
0.75	25	1.00	7	28										4.4	46.8
1.00	25	1.00	65	260	打撃									19.4	120.0
1.08	8	1.00	117	1462	硬等									99.9	120.0


調査日	2023年03月27日					測点	002		レベル	K B M -0.15m					天候	晴				
調査名											調査機器	ジオカルテ								
調査住所	三重県津市安濃町										試験者名									
使用算式: $q_a = 30.0 + 0.6N_{sw}$ 但し、 $N_{sw}=150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで回転距離以外の自沈の場合、 q_a (支持力) は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 $N = 3W_{sw} + 0.050N_{sw}$ 砂質土の場合 $N = 2W_{sw} + 0.067N_{sw}$										最終貫入状況					硬等					
										水 位					無					
										最終貫入量					1.65m					
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Nsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)					推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)			
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.25	0.50 0.75	1.00 0.75	50	100	150	200	250	300					
0.25	25	0.05	0	0		無回転距離											0.1	-		
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む											3.6	37.2		
0.75	25	1.00	4	16		自沈含む											3.8	39.6		
1.00	25	1.00	0	0		無回転距離											3.0	-		
1.25	25	1.00	8	32													4.6	49.2		
1.50	25	1.00	57	228													17.2	120.0		
1.65	15	1.00	110	733		硬等											51.1	120.0		

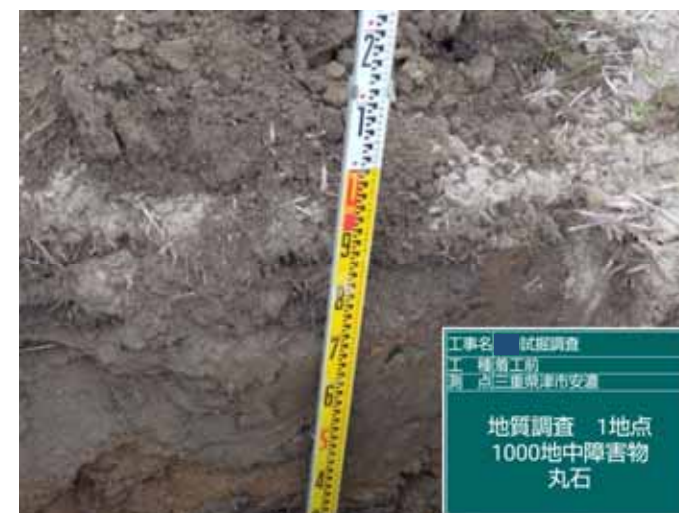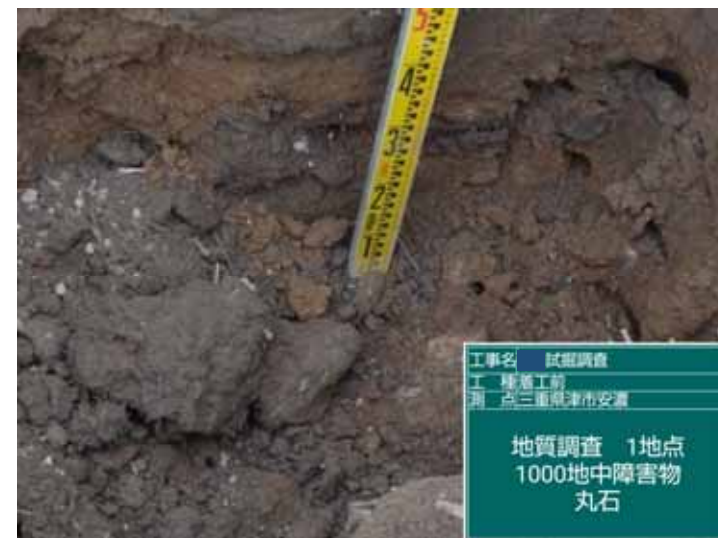






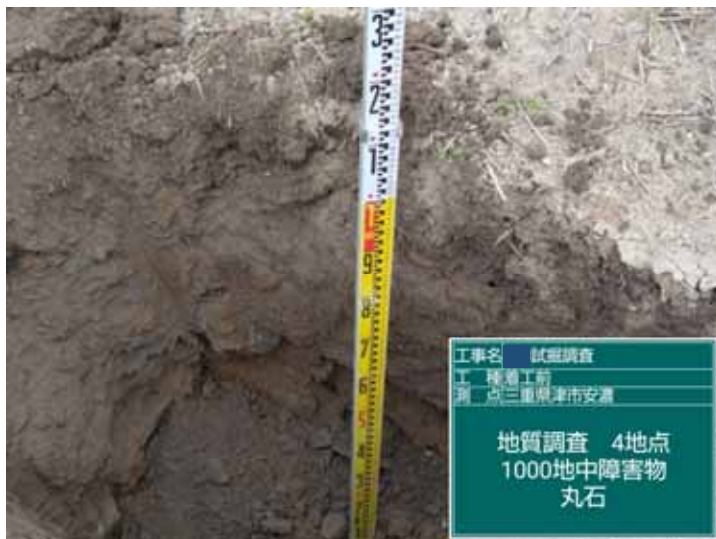

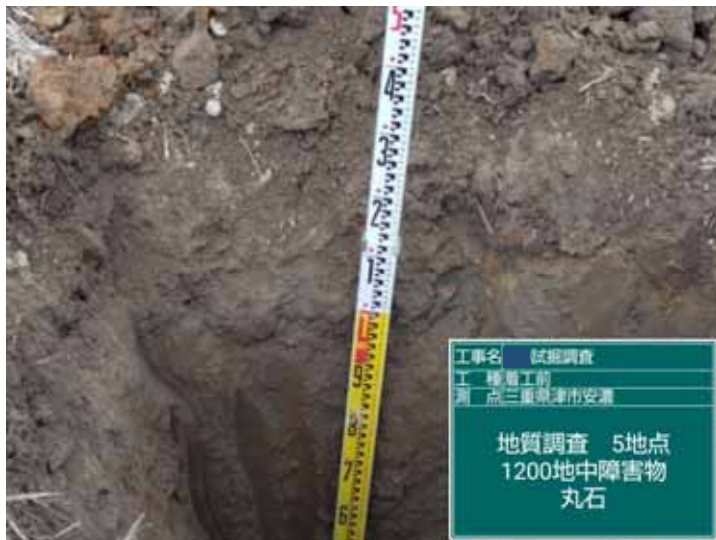


調査日	2023年03月27日	測 点	004	レベル	K B M -0.02m	天候	晴				
調査名						調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県津市安濃町					試験者名					
使用算式:	qa=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転継続以外の自沈の場合、qa〔支持力〕は「-」を表示					最終貫入状況	破等				
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw					水 位	無				
						最終貫入量	1.84m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Nsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事	荷 重 Nsw (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回) 50 100 150 200 250 300	推定土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)
0.25	25	0.05	0	0	無回転継続					0.1	-
0.50	25	1.00	3	12	自沈含む					3.6	37.2
0.75	25	1.00	0	0	無回転継続					3.0	-
1.00	25	1.00	1	4	自沈含む					3.2	32.4
1.25	25	1.00	7	28						4.4	46.8
1.50	25	1.00	56	224	打撃					17.0	120.0
1.75	25	1.00	40	160	ガリガリ					12.7	120.0
1.84	9	1.00	116	1289	破等					88.3	120.0

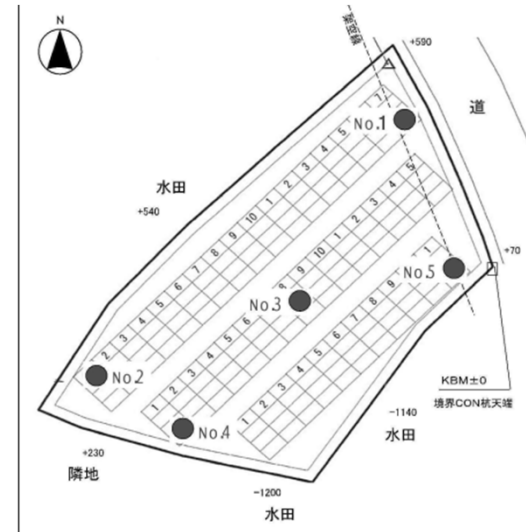


地中障害ありコストUP

調査日	2023年03月27日					測点	001	レベル	K B M -0.05m			天候	晴						
調査名												調査機器	ジオカルテ						
調査住所	三重県津市安濃町											試験者名							
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転継続以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示											最終貫入状況	破等						
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw											水 位	無						
												最終貫入量	1.39m						
貫入 深さ D (m)	貫入 量 L (cm)	荷重 Rsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事			荷 重 Rsw (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回) 50 100 150 200 250 300					推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)
0.25	25	0.05	0	0	音感・感触 自沈状況											0.1	-		
0.50	25	1.00	4	16	無回転継続											3.8	39.6		
0.75	25	1.00	6	24	自沈含む											4.2	44.4		
1.00	25	1.00	0	0	無回転継続											3.0	-		
1.25	25	0.50	0	0	無回転継続											1.5	-		
1.39	14	1.00	120	857	破等											59.4	120.0		


調査日	2023年03月27日					測点	003		レベル	K B M -0.02m			天候	晴		
調査名													調査機器	ジオカルテ		
調査住所	三重県津市安濃町												試験者名			
使用算式: $q_a = 30.0 + 0.6N_{sw}$ 但し、 $N_{sw}=150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで回転速度以外の自沈の場合、 q_a (支持力) は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 $N = 3W_{sw} + 0.050N_{sw}$ 砂質土の場合 $N = 2W_{sw} + 0.067N_{sw}$												最終貫入状況	破等			
												水位	無			
												最終貫入量	1.86m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 R _{sw} (kN)	N _a (回)	1m当たり 半回転数 N _{sw} (回)	記 事		荷 重 W _{sw} (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75			貫入量1m当たりの半回転数 N _{sw} (回) (図) 50 100 150 200 250 300			推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m)
0.25	25	0.05	0	0	音感・感触 自沈状況										0.1	—
0.50	25	1.00	2	8	無回転継続										3.4	34.8
0.75	25	1.00	5	20	自沈含む										4.0	42.0
1.00	25	0.75	0	0	無回転継続										2.2	—
1.25	25	1.00	1	4	自沈含む										3.2	32.4
1.50	25	1.00	20	80											7.3	78.0
1.75	25	1.00	69	276	打撃										20.4	120.0
1.86	11	1.00	114	1036	破等										71.4	120.0

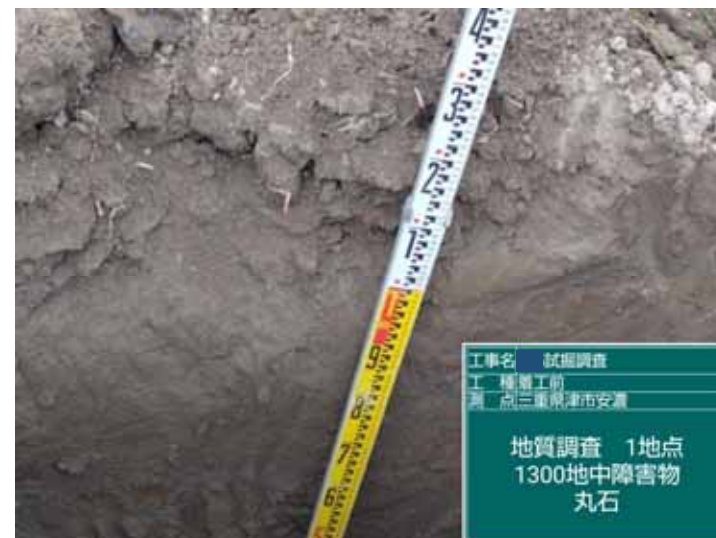

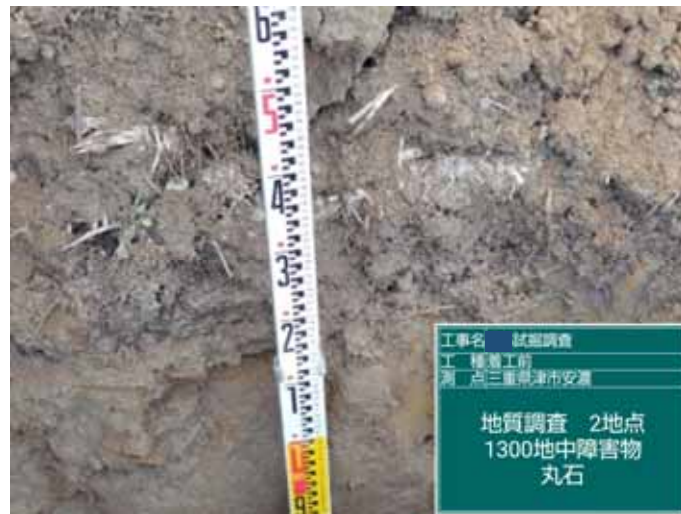






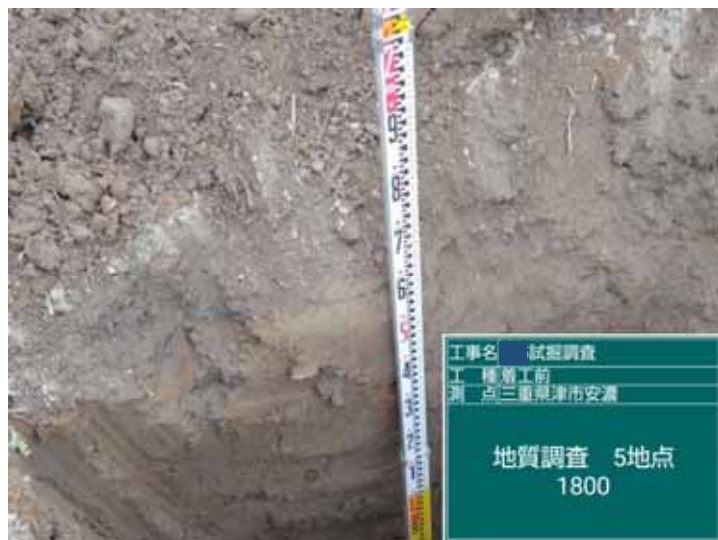


調査日	2023年02月13日					測点	001	レベル	K B M -0.03m			天候	雨				
調査名												調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県津市新家町											試験者名					
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転経路以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示											最終貫入状況	打撃				
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw											水 位	不明				
												最終貫入量	1.75m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)			推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00								
							0.25	0.75		50	100	150	200	250	300		
0.25	25	0.15	0	0		無回転経路										0.4	-
0.50	25	1.00	1	4		自沈含む										3.2	32.4
0.75	25	1.00	11	44												5.2	56.4
1.00	25	1.00	19	76		ガリガリ										7.0	75.6
1.25	25	1.00	22	88		ガリガリ										7.8	82.8
1.50	25	1.00	36	144		ガリガリ										11.6	116.4
1.75	25	1.00	121	484		打撃										34.4	120.0


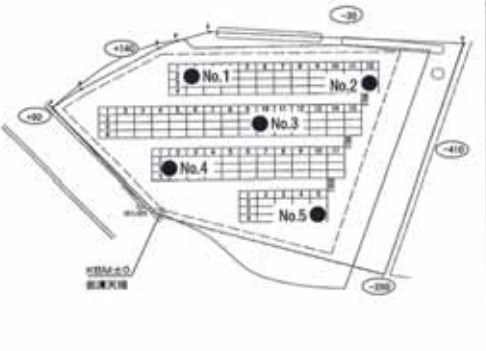



多少硬いが打設可能
水が出るところは一部補強
湧き水あり。

調査日	2023年02月13日	測点	005	レベル	K B M -0.06m	天候	雨										
調査名						調査機器	ジオカルテ										
調査住所	三重県津市新家町					試験者名											
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転経路以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示					最終貫入状況	打撃										
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw					水 位	不明										
						最終貫入量	1.75m										
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事	荷 重 Wsw (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)			推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)		
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00	50	100	150	200	250	300		
							0.25	0.75									
0.25	25	0.75	0	0		無回転経路										2.2	-
0.50	25	1.00	0	0		無回転経路										3.0	-
0.75	25	1.00	2	8		自沈含む										3.4	34.8
1.00	25	1.00	12	48												5.4	58.8
1.25	25	1.00	14	56												5.8	63.6
1.50	25	1.00	61	244		打撃										18.3	120.0
1.75	25	1.00	121	484		打撃										34.4	120.0

調査日	2023年02月13日					測点	003	レベル	K B M	-0.04m	天候	雨			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県津市新家町										試験者名				
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転経路以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	硬等			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	不明			
											最終貫入量	1.86m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)		貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)		推定土質	推定水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	50 100 150 200 250 300							
0.25	25	0.05	0	0		無回転経路								0.1	-
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む								3.6	37.2
0.75	25	1.00	10	40										5.0	54.0
1.00	25	1.00	21	84		ガリガリ								7.6	80.4
1.25	25	1.00	15	60										6.0	66.0
1.50	25	1.00	40	160		打撃								12.7	120.0
1.75	25	1.00	83	332		打撃								24.2	120.0
1.86	11	1.00	105	955		硬等								65.9	120.0

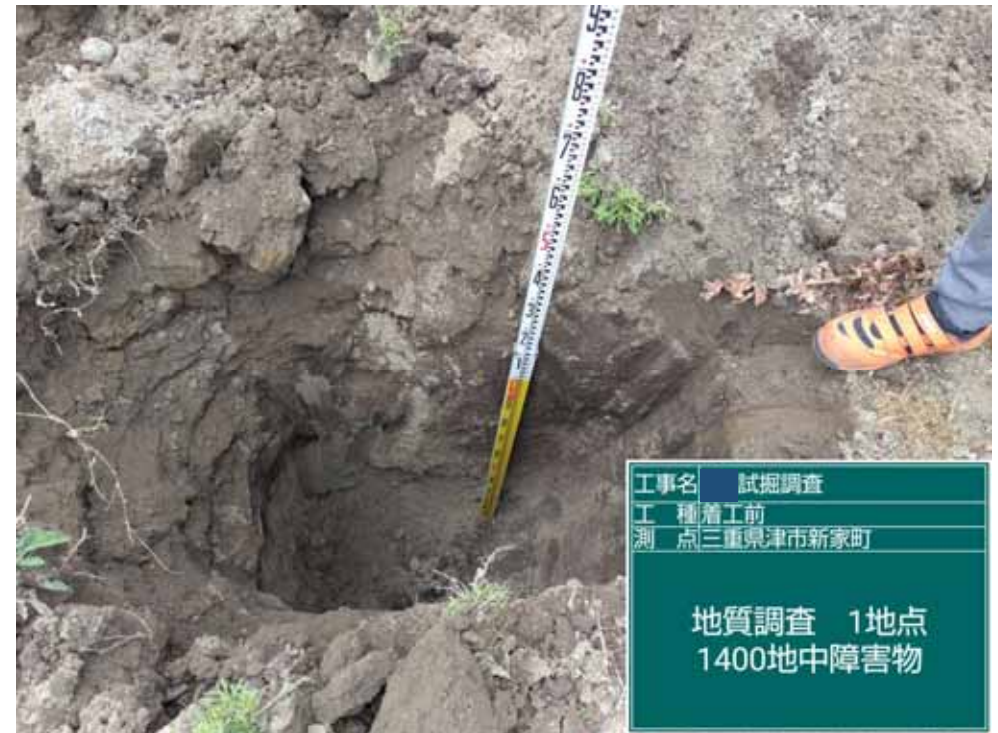

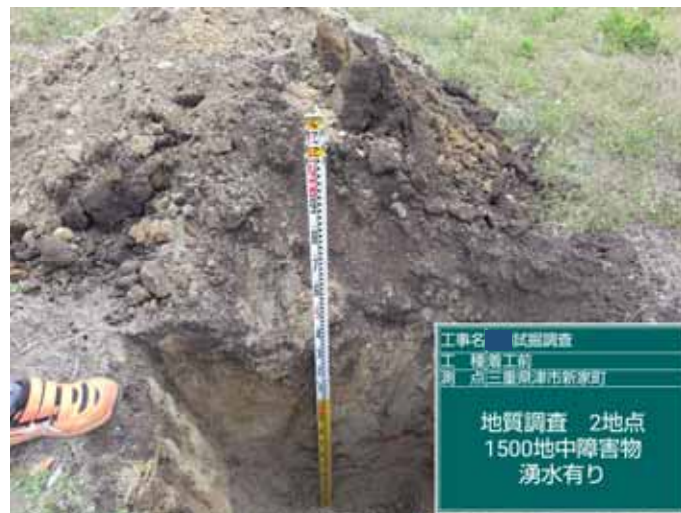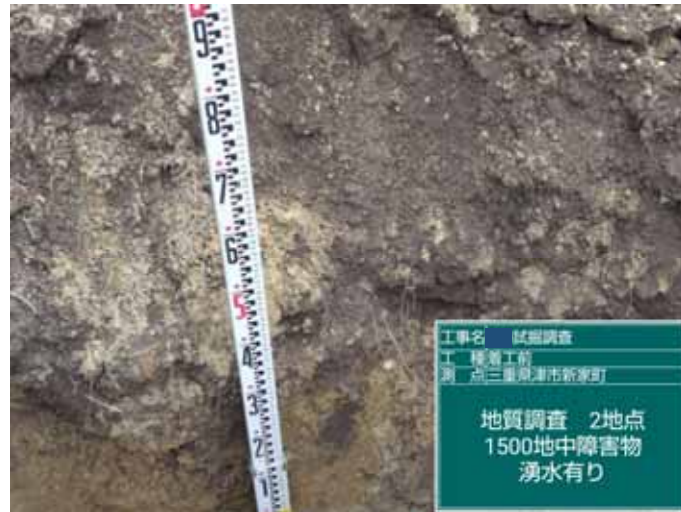

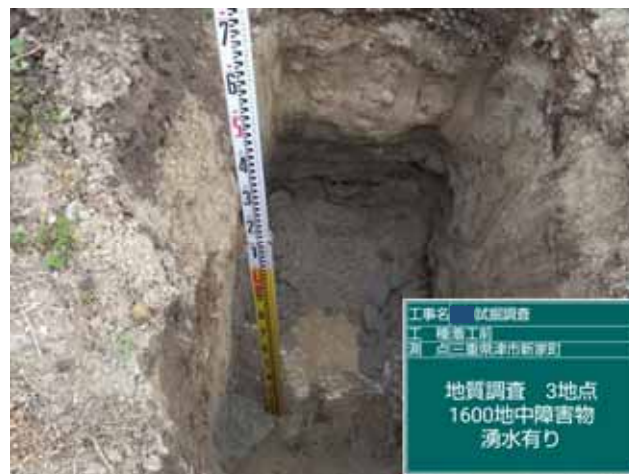



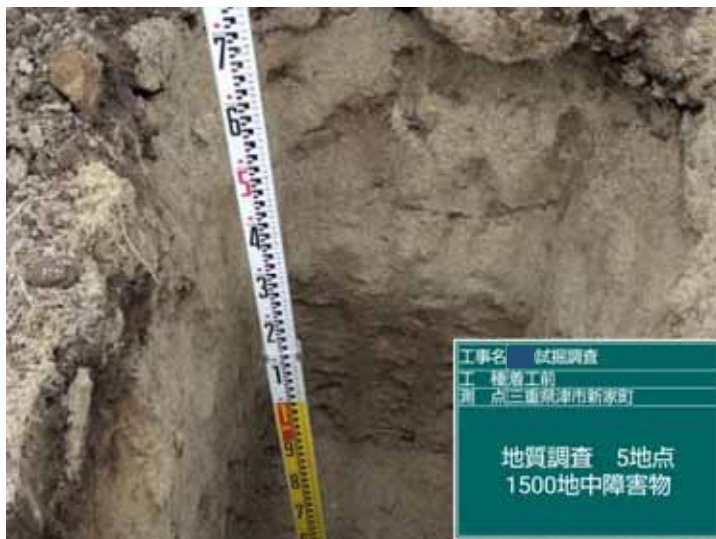



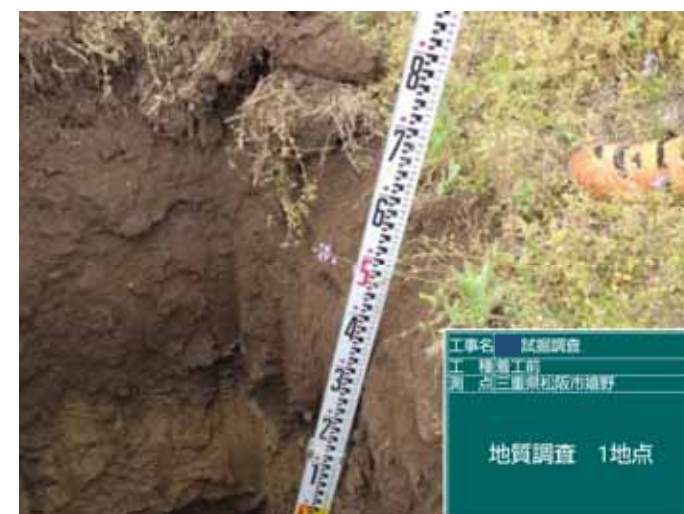


表 11	2022年12月15日	资产	5054	100%	无异常	无异常	无
资产							
流动资产	1	1	1	1	1	1	1
货币资金	1	1	1	1	1	1	1
应收账款	1	1	1	1	1	1	1
预付款项	1	1	1	1	1	1	1
其他应收款	1	1	1	1	1	1	1
存货	1	1	1	1	1	1	1
流动资产合计	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产	1	1	1	1	1	1	1
长期股权投资	1	1	1	1	1	1	1
固定资产	1	1	1	1	1	1	1
无形资产	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产合计	1	1	1	1	1	1	1
资产总计	1	1	1	1	1	1	1
负债							
流动负债	1	1	1	1	1	1	1
短期借款	1	1	1	1	1	1	1
应付账款	1	1	1	1	1	1	1
预收款项	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	1	1	1	1	1	1	1
流动负债合计	1	1	1	1	1	1	1
非流动负债	1	1	1	1	1	1	1
长期借款	1	1	1	1	1	1	1
应付债券	1	1	1	1	1	1	1
非流动负债合计	1	1	1	1	1	1	1
负债合计	1	1	1	1	1	1	1
所有者权益							
实收资本	1	1	1	1	1	1	1
资本公积	1	1	1	1	1	1	1
盈余公积	1	1	1	1	1	1	1
未分配利润	1	1	1	1	1	1	1
所有者权益合计	1	1	1	1	1	1	1
负债和所有者权益总计	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]


表 3-1	2012 年度(2013 年 3 月 31 日) 资产负债表	单位: 万元	币种: 人民币	附注	备
流动资产					
货币资金	1,000,000.00				
应收账款	1,000,000.00				
预付款项	1,000,000.00				
其他应收款	1,000,000.00				
存货	1,000,000.00				
流动资产合计	5,000,000.00				
非流动资产					
长期股权投资	1,000,000.00				
固定资产	1,000,000.00				
无形资产	1,000,000.00				
非流动资产合计	3,000,000.00				
资产总计	8,000,000.00				
流动负债					
短期借款	1,000,000.00				
应付账款	1,000,000.00				
预收款项	1,000,000.00				
其他应付款	1,000,000.00				
流动负债合计	4,000,000.00				
非流动负债					
长期借款	1,000,000.00				
非流动负债合计	1,000,000.00				
负债合计	5,000,000.00				
所有者权益					
实收资本	1,000,000.00				
资本公积	1,000,000.00				
盈余公积	1,000,000.00				
未分配利润	1,000,000.00				
所有者权益合计	3,000,000.00				
负债和所有者权益总计	8,000,000.00				

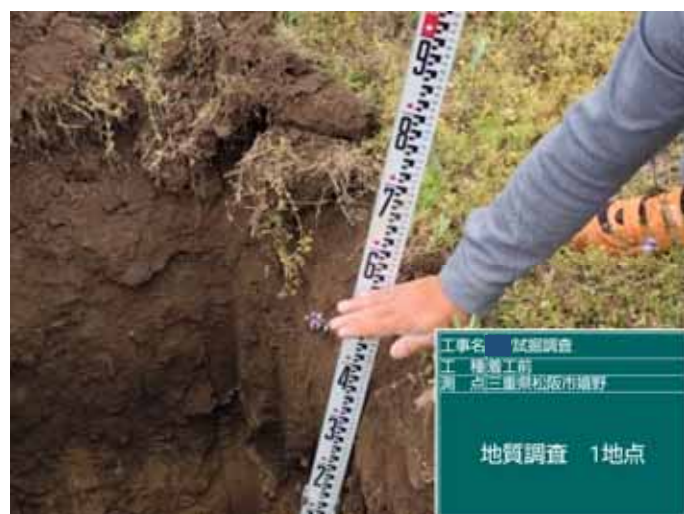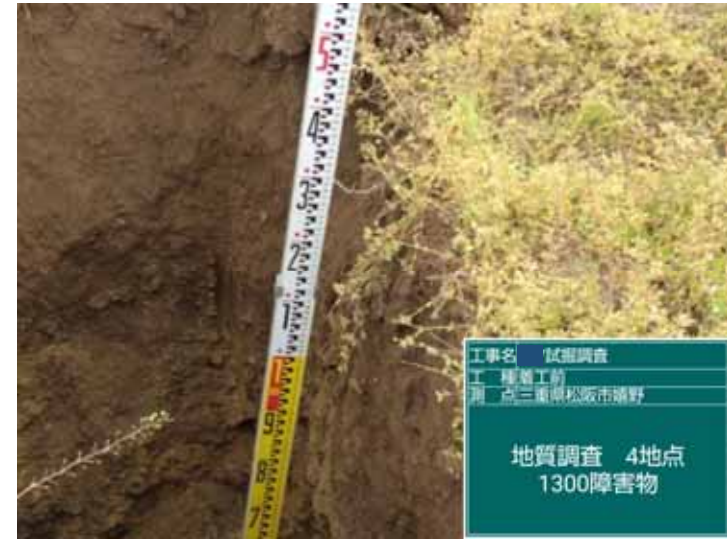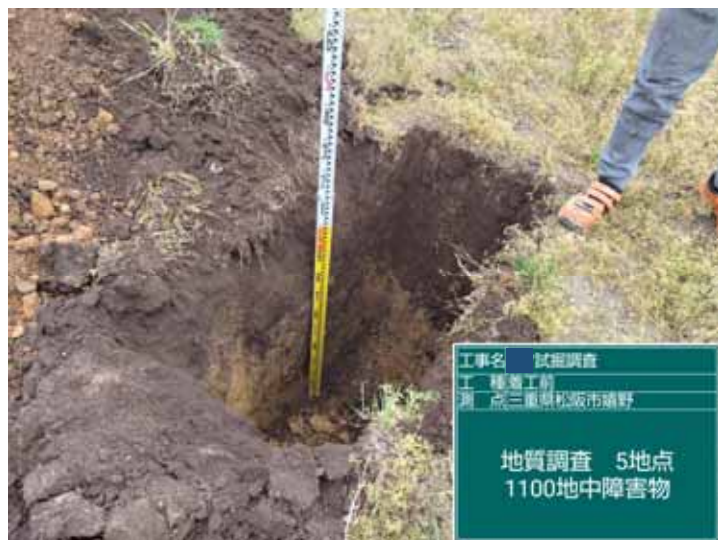
[illegible]












調査日	2023年02月13日					測点	003	レベル	K B M	-0.44m	天候	小雨			
調査名											調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県津市白山町										試験者名				
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	硬等			
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	不明			
											最終貫入量	1.82m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					音感・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00						
							0.25	0.75		50 100 150 200 250 300					
0.25	25	0.25	0	0		無回転繰返し								0.7	-
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む								3.6	37.2
0.75	25	1.00	0	0		回転急速								3.0	-
1.00	25	1.00	0	0		回転急速								3.0	-
1.25	25	1.00	5	20										4.0	42.0
1.50	25	1.00	5	20										4.0	42.0
1.75	25	1.00	70	280	打撃									20.7	120.0
1.82	7	1.00	117	1671	硬等									113.9	120.0

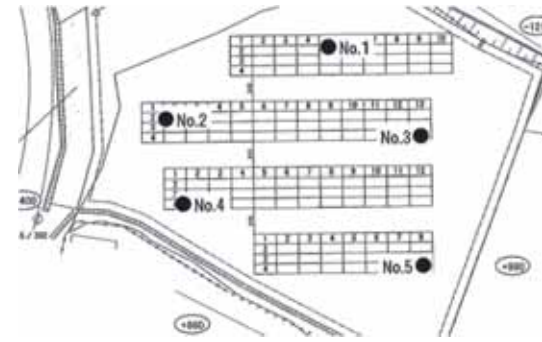

測点4：粘土とパサパサの土
2mに障害なし
1800mmの通常杭で対応可能か
確認。

調査日	2023年02月13日					測点	005		レベル	K B M -0.37m		天候	小雨			
調査名												調査機器	ジオカルテ			
調査住所	三重県津市白山町											試験者名				
使用算式: $qa' = 30.0 + 0.6N_{sw}$ 但し、 $N_{sw} = 150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、 qa' (支持力) は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 $N = 3W_{sw} + 0.050N_{sw}$ 砂質土の場合 $N = 2W_{sw} + 0.067N_{sw}$											最終貫入状況		硬等			
											水 位		不明			
											最終貫入量		1.37m			
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 W _{sw} (kN)	半回転数 N _a (回)	1m当たり 半回転数 N _{sw} (回)	記 事		荷 重 W _{sw} (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75	貫入量1m当たりの半回転数 N _{sw} (回) 50 100 150 200 250 300	推定 土質	推定 水位	換 N 値	支持力 (kN/m ²)				
					音感・感触	自沈状況										
0.25	25	1.00	0	0		無回転繰返し						3.0	-			
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む						3.6	37.2			
0.75	25	1.00	5	20								4.0	42.0			
1.00	25	1.00	6	24								4.2	44.4			
1.25	25	1.00	5	20								4.0	42.0			
1.37	12	1.00	124	1033	硬等							71.2	120.0			

調査日	2023年02月13日					測点	001	レベル	K B M	-0.40m	天候	小雨		
調査名											調査機器	ジオカルテ		
調査住所	三重県津市白山町										試験者名			
使用算式:	qa'=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、qa' (支持力) は「-」を表示										最終貫入状況	硬等		
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw										水 位	不明		
											最終貫入量	1.93m		
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事		荷 重 Wsw (kN) 0.05 0.50 1.00 0.25 0.75			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/㎡)
					音感・感触	自沈状況				50 100 150 200 250 300				
0.25	25	0.50	0	0		無回転繰返し							1.5	—
0.50	25	1.00	3	12		自沈含む							3.6	37.2
0.75	25	0.75	0	0		無回転繰返し							2.2	—
1.00	25	1.00	0	0		無回転繰返し							3.0	—
1.25	25	1.00	6	24									4.2	44.4
1.50	25	1.00	18	72									6.8	73.2
1.75	25	1.00	12	48	ガリガリ								5.2	58.8
1.93	18	1.00	111	617	硬等								43.3	120.0







工事名	試掘調査
工種	着工前
測点	三重県津市白山

地質調査 3地点
1800障害物



工事名	試掘調査
工種	着工前
測点	三重県津市白山


地質調査 3地点
1800障害物







調査日	2023年04月16日					測点	002	レベル	K B M +0.19m	天候	晴						
調査名										調査機器	ジオカルテ						
調査住所	三重県鈴鹿市郡山町									試験者名							
使用算式: $q_a'' = 30.0 + 0.6N_{sw}$ 但し、 $N_{sw} = 150$ を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、 q_a'' [支持力] は「-」を表示 換算N値: 粘性土の場合 $N = 3W_{sw} + 0.050N_{sw}$ 砂質土の場合 $N = 2W_{sw} + 0.067N_{sw}$										最終貫入状況	打撃						
										水 位	無						
										最終貫入量	1.25m						
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 N_{sw} (kN)	半回転数 N_a (回)	1m当たり 半回転数 N_{sw} (回)	記 事		荷 重 N_{sw} (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 N_{sw} (回)			推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)	
					貫通・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00	50	100	150	200	250	300		
0.25	25	0.50	0	0	無回転繰返し											1.5	—
0.50	25	1.00	0	0	無回転繰返し											3.0	—
0.75	25	1.00	11	44												5.2	56.4
1.00	25	1.00	63	252	打撃											18.8	120.0
1.25	25	1.00	131	524	打撃											37.1	120.0



調査日	2023年04月16日					測点	001	レベル	K B M +0.15m	天候	晴				
調査名										調査機器	ジオカルテ				
調査住所	三重県鈴鹿市郡山町									試験者名					
使用算式:	qa''=30.0+0.6Nsw 但し、Nsw=150を超える場合は150とする 荷重1kNで回転繰返し以外の自沈の場合、qa'' [支持力] は「-」を表示									最終貫入状況	硬等				
換算N値:	粘性土の場合 N=3Wsw+0.050Nsw 砂質土の場合 N=2Wsw+0.067Nsw									水 位	無				
										最終貫入量	1.00m				
貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当たり 半回転数 Nsw (回)	記 事	荷 重 (kN)			貫入量1m当たりの半回転数 Nsw (回)	推定 土質	推定 水位	換 算 N 値	支持力 (kN/m ²)		
					貫通・感触	自沈状況	0.05	0.50	1.00	50	100	150	200	250	300
0.25	25	1.00	1	4		自沈含む									
0.50	25	1.00	11	44											
0.75	25	1.00	30	120											
1.00	25	1.00	173	692	硬等										

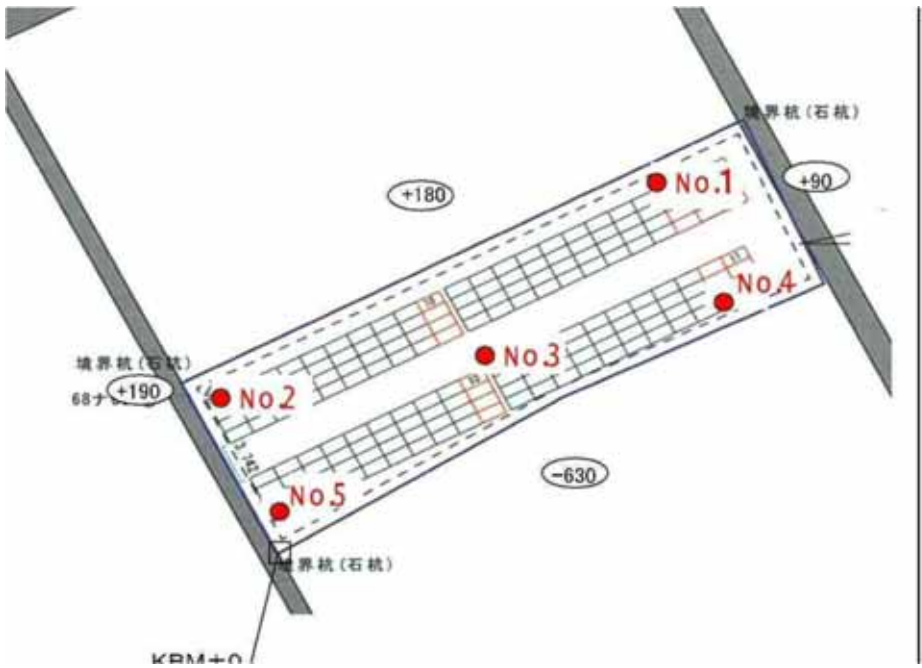


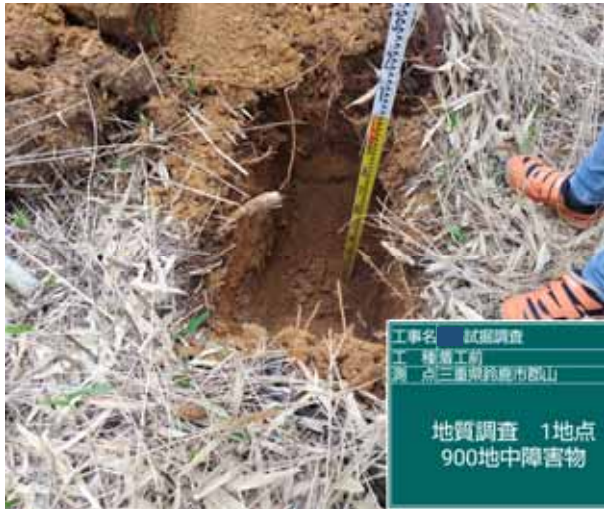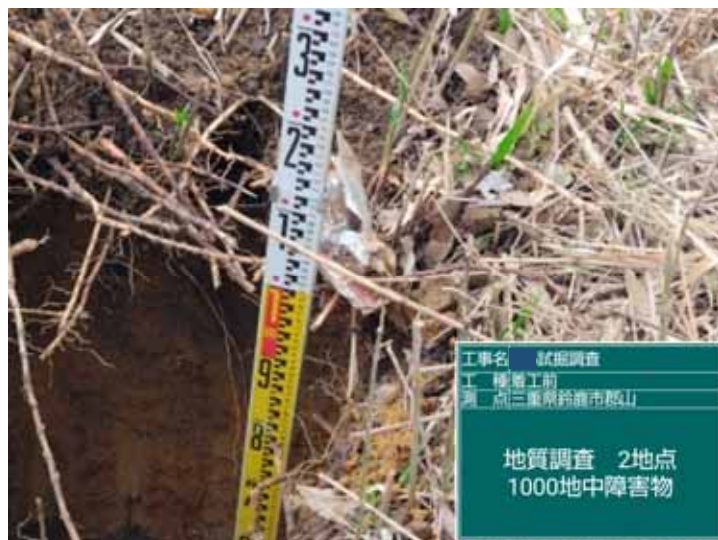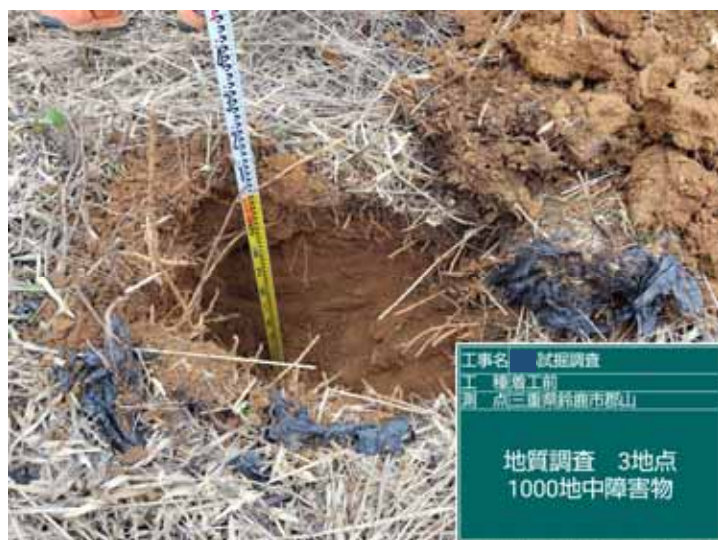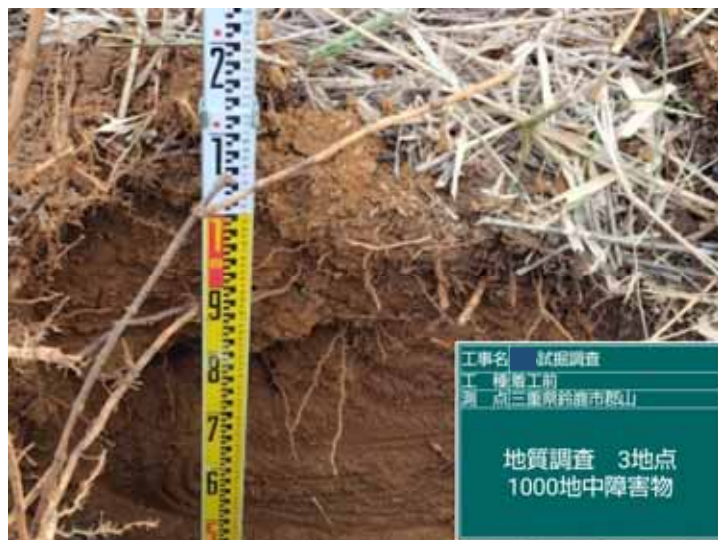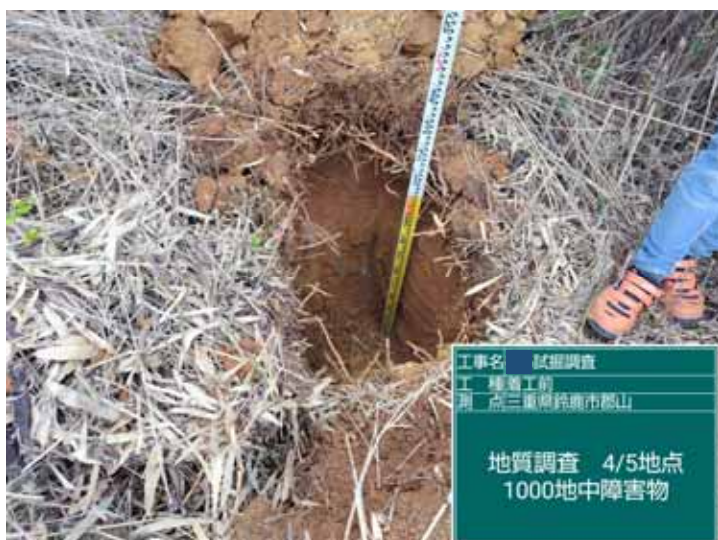1mで障害。全掘杭埋め。
敷地全面笹、竹。伐採処分費用の見積もり過小。
天地返しと処分費用再試算要。










改良土投入

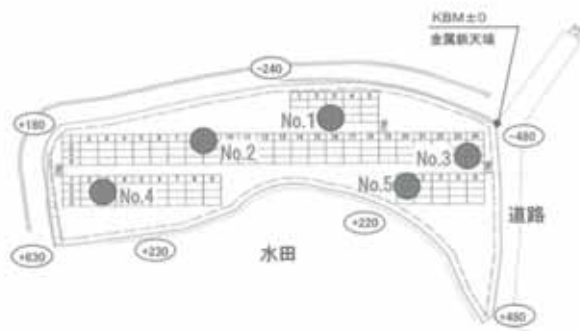[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



